


## 关于景区天南锁钥至咖啡厅片区

### 安防监控建设方案

炮台景区改造后新增游览线路从百米榕道驿站对面入口，沿途和咖啡厅新增 8 个点位的监控，摄像头通过 POE 和直流电源独立供电，网络连接通过六类网线分别连接到百米榕道和天南锁钥的弱电箱，图像数据汇聚到机房进行集中存储管理。

安装工作由景区组织人员自行处理，景区根据设备清单已经在京东完成询价，所需配件由厦门本地供应商供货，要求供货商根据配件清单供货，建设过程中清单外的小配件兜底供货至项目完成，总价格 1 万元以下。

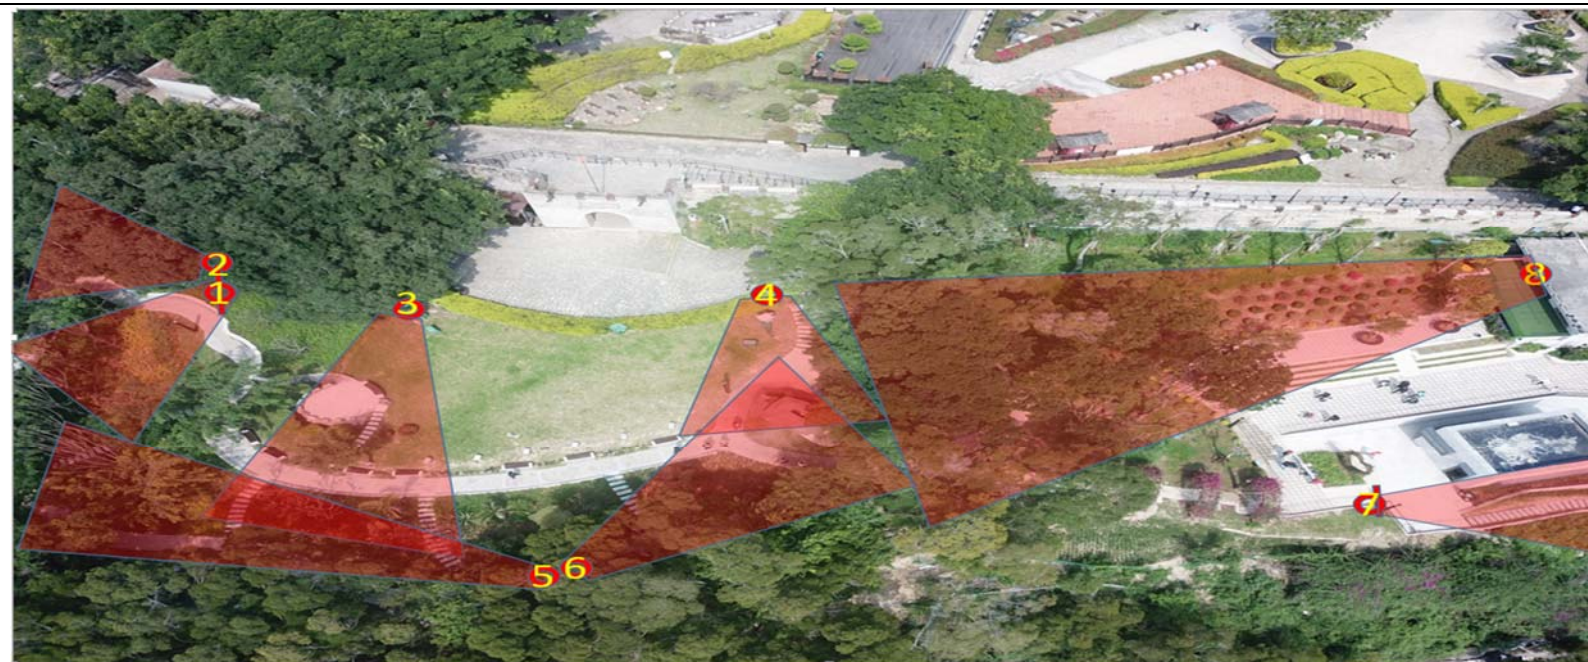


- 1、8 个点位，采购新镜头，镜头根据点位情况使用不同焦距；
- 2、第 1 和第 7 点位需立杆，立杆预埋件不小于 0.3M\*0.3M\*0.6M 水泥基座；
- 3、网线、电源线等均需通过 PVC 管做附挂外墙或通过绿地浅埋处理；



## 景区天南锁钥至咖啡厅片区安防监控设备清单

序号	点位	交换机数量	焦距	立杆	供电电源	支架
1	①	1	4MM	1	POE	1
2	②	1	4MM	0	POE	1
3	③	0	6MM	0	POE	1
4	④	0	4MM	0	POE	1
5	⑤	0	6MM	0	1	1
6	⑥	1	6MM	0	1	1
7	⑦	1	12MM	1	1	0
8	⑧	1	12MM	0	1	0
汇总		5		2		6

序号	名称	产品外观	单位	数量	单价	合计	品牌
1	全彩摄像机 400 万		台	6	492	2952	海康威视 <a href="https://item.jd.com/100000502494.html">https://item.jd.com/100000502494.html</a>
2	自动变焦全彩 400 万		台	2	700	1400	<a href="https://item.jd.com/100019290469.html#none">https://item.jd.com/100019290469.html#none</a>
3	壁装支架		个	6	30	180	海康威视
4	网线 6 类		箱	3	649	1947	TP-LINK 六类千兆网线 <a href="https://item.jd.com/100012659752.html#crumb-wrap">https://item.jd.com/100012659752.html#crumb-wrap</a>
5	电源线		米	200	3.2	640	太阳电缆

6	千兆交换机		台	3	139	417	Tplink 交换机 <a href="https://item.jd.com/3660988.html">https://item.jd.com/3660988.html</a>
7	5口千兆 PoE 交换机		台	2	285	570	<a href="https://item.jd.com/2220821.html">https://item.jd.com/2220821.html</a>
8	PVC 管 25		米	100	4	400	联塑
9	电源		个	4	30	120	海康威视
10	户外弱电盒		个	3	60	180	<a href="https://item.jd.com/100061760106.html#crumb-wrap">https://item.jd.com/100061760106.html#crumb-wrap</a>
11	监控立杆及其它辅材		批	1	1000	1000	
12	人工费	景区自行处理		0	0	0	
13	总价合计	9806					
